

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N°

Nombre de la Obra:

"Rehabilitación de red de drenaje Sanitario  
en la calle Abasolo en el municipio de Sayula, Jalisco"

No. de Contrato: SAY-OP/AD/06/2021

Monto total de la obra: \$ 1,553,914.96

Inicio de obra: 18 Marzo 2021

Terminación de obra: 31 Marzo 2021

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Ing. ~~Rodrigo Ponce Bernabe~~

Ing. ~~Sergio Cabrera~~  
Contratista.



SAYULA  
AYUNTAMIENTO 2016-2021  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS



# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 18 / 03 / 2021

N° 001

Asentando en esta bitácora, el presente día se da inicio con los trabajos de la obra "Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Abasco en el municipio de Sayula, Jalisco", dando inicio con trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel, utilizando, crucetas, estacas, hilos, marcas y trazos con calhidra.

Previo al trazo se continúa con la excavación para la línea principal por medios mecánicos.

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe.  
Dir. Obras Públicas



SAYULA  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS

Ing. Sergio Cabrera  
Contratista.




# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 20 / 03 / 2021


N° 002

Asentando en esta bitácora al presente día  
se continúan con los trabajos después de retirar  
el material producto de la excavación, el afine  
de la zanja de la excavación hecha a máquina.

  
Ing. Rodrigo Ponce Benabé  
Dir. Obras Públicas



SAYULA  
AYUNTAMIENTO 2016-2021  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS

  
Ing. Sergio Cabrera  
Contratista.



# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 22 / 03 / 2021

N° 003

Al presente día se continúan con los trabajos de relleno, elaborando una plantilla de 10 cm de espesor promedio con material mano de obra y supervisión, acostillado, relleno en cepas.

  
Ing. Rodrigo Ponce Benabe  
Dir. Obras Públicas.



  
Ing. Sergio Cabrera  
Contratista.




# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 25 / 03 / 2021

N° 004

Se continúan con los trabajos de instalación de tubería, colocación de tubo de PVC S-25 de 12" de diámetro y se prosigue a la colocación de descargas domiciliarias mediante silleta de 12" x 6", tubo de descarga de 6" así como la construcción de los registros para la conexión de la descarga domiciliar fuera del domicilio.

Posteriormente se comienza con la construcción de los pozos de visita mediante plantilla de zampeado de mampostería, media caña, dala de desphante, muro tezón, enjarres, tapa y todo lo necesario para su elaboración.

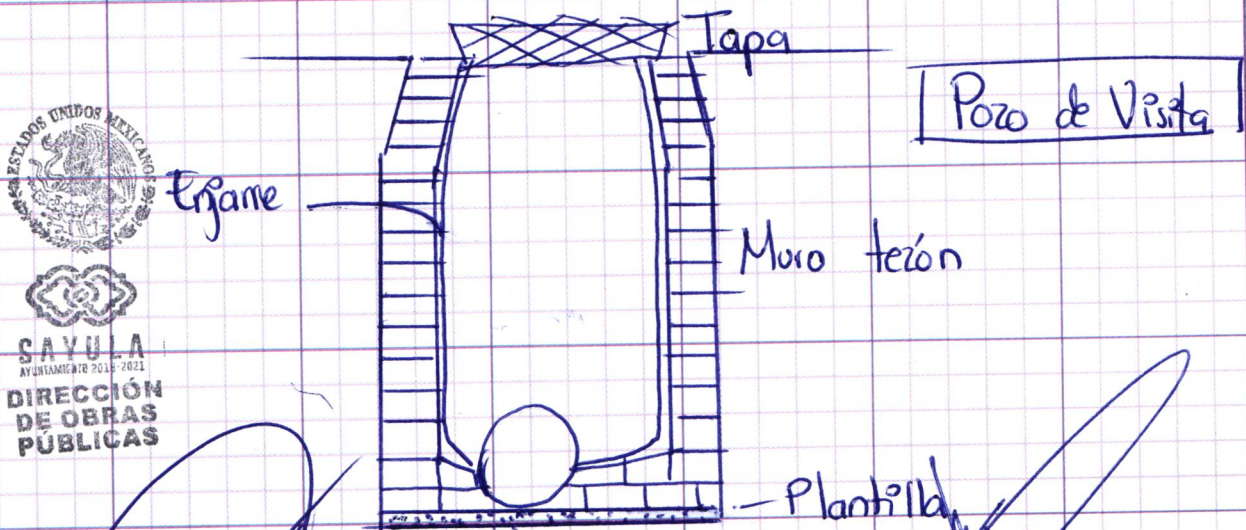

Ing. ~~Rodrigo~~ Ponce Bernabe  
Dir. Obras Públicas.

Ing. Sergio Cabrera  
Contratista




# BITÁCORA DE OBRA


FECHA 31 / 03 / 2021

N° 005

Asentando en ésta bitácora, al presente día se dan por culminados los trabajos de la obra denominada "Rehabilitación de red de drenaje Sanitario en la Calle Abasolo en el municipio de Sayula, Jalisco", culminando con la limpieza general de la obra.

  
Ing. Rodrigo Ponce Bernabe  
Dir. de obras Públicas



  
Ing. Sergio Cabrera,  
Contratista.
